中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-C-0564

项目名称 中国能建沙特凯西姆II燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	施工		合同编号	SAQ2-GCHT-2024-046
合同名称	主机、空冷器及高压管道安装工程			
收款单位	单位名称：	Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal Power Construction Co., Ltd		
	账户名称：	Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal Power Construction Co., Ltd		
	开户银行：	The Saudi Awwal Bank		
	银行账号：	SA8645000000242429082001		
合同总额(元)	445,220,820.34		已支付(元)	343,337,448.11
申请支付金额	7,716,382.97		币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00		预提税率	
预提税金额(原币)	0.00		不含预提税支付金额(原币)	0
是否确认收回	否		预计回收时间	
垫支原因				

本次进度款申请，不含税产值金额为7893997.92SAR，含税产值金额为90787097.61SAR，扣除保证金1361714.64SAR(5%安全保证金+10%预付款扣回)，开票金额为7716382.97SAR，本次应付7716382.97SAR。

施工经理(签署)： 陈新林 日期： 2026-10-22

同意

发起部门岗位经理(签署)：宗纪州 日期： 2026-10-24

同意

发起部门分管领导(签署)：王振杰 日期： 2026-10-25

已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 7716382.97 SAR 7716382.98 SAR ,同意支付 7716382.97 SAR。

财务专责(签署)： 曹阳 日期： 2026-10-25

同意

财务经理(签署)： 王勋 日期： 2026-10-25

项目副经理(联营体成员方)(签署)：			日期：				
同意 项目经理(签署)：	彭其润		日期：	2026-10-25			
同意。 分公司负责人(签署)：	贾震江		日期：	2026-10-26			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 7716382.97 SAR，7716382.98 SAR，同意支付 财务人员(签署)：	曹阳	日期：	2026-10-25	同意 财务部负责人(签署)：	郑敏	日期：	2026-10-27
同意 公司主管领导(签署)：	范永春	日期：	2026-11-04	同意 总会计师(签署)	潘大明	日期：	46322.48191
总经理(签署)：		日期：		董事长(签署)：		日期：	

中国能源建设集团浙江火电建设有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP ZHEJIANG THERMAL POWER CONSTRUCTION CO., LTD.

Tax invoice فاتورة ضريبية

رقم مرجع الفاتورة (IRN): INV00026

تاريخ الإصدار (Issue Date): 2026-10-15
وقت الإصدار (Issue Time): 16:00:00
تاريخ التوريد (Supply Date): 2026-10-15

تعريف المورد (Seller Identification)

اسم المورد (Seller name): فرع شركة تشاينا اينيرجي انجينيرنج جروب زهيجيا نغ ثيرمال باور كونستركشن كومباني ليمتد | ZTPC
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة (VAT registration number): 312344878100003
معرف البائع الإضافي (Additional Seller ID): CRN - 1009007591

تعريف العميل (Buyer Identification)

اسم العميل (Buyer name): شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليمتد | China Energy International Group Company Limited
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة (VAT registration number): 311502140100003

Seller Address	عنوان المورد	Buyer Address	عنوان العميل
Street Name	**اسم الشارع**	**Street Name**	**اسم الشارع**
Prince Saud Al Kabeer Ibn Abdulaziz Aal Saud	الأمير سعود الكبير بن عبدالعزيز آل سعو	King Fahad Branch	الملك فهد الفرعي
Building number	**رقم المبنى**	**Building number**	**رقم المبنى**
3597	3597	7421	7421
Postal Code	**الرمز البريدي**	**Postal Code**	**الرمز البريدي**
13214	13214	12212	12212
City	**مدينة**	**City**	**مدينة**
Riyadh	الرياض	Riyadh	الرياض
District	**حي**	**District**	**حي**
Al Quds Dist.	حي القدس	Al Olaya Dist.	حي العليا
Country code	**رمز الدولة**	**Country code**	**رمز الدولة**
SA	SA	SA	SA

وصف السلعة او الخدمة Product or Service Description	سعر الوحدة Unit Price	الكمية Quantity	المجموع غير شامل ضريبة القيمة المضافة Subtotal Exclusive of VAT	نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT Rate	قيمة الضريبة VAT Amount	المجموع شامل ضريبة القيمة المضافة Subtotal Inclusive of VAT
دفعة أولية للأعمال الداخلية للمشروع Interim of onshore payment for the project	﷼ 6,709,898.24	1.00	﷼ 6,709,898.24	15.00	﷼ 1,006,484.74	﷼ 7,716,382.98

Invoice Total Amount (excluding VAT)	اجمالي مبلغ الفاتورة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)	﷼ 6,709,898.24
VAT total amount	إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة	﷼ 1,006,484.74
Invoice Gross Total (inclusive of VAT)	إجمالي الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة)	﷼ 7,716,382.98
Invoice Total Payable Amount (inclusive of VAT)	إجمالي مبلغ الفاتورة المستحق الدفع (شامل ضريبة القيمة المضافة)	﷼ 7,716,382.98

شروط الدفع (Payment Terms)

طريقة الدفع (Payment method): الدفع لحساب بنكي (Payment to bank account)

Payment Due date: progress payment
Payment Bank Details:
Bank:Saudi Awwal Bank
IBAN:SA8745000000242429082080
Account #: 242429082080
SWIFT code: SABBSARI

中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

Main Mechanical & Air Cooled Condenser & HP PipingInstallation Project

No.:SAQ2-GCHT-2024-046-ZF019

Subcontractor 分包方（银行账户名称）：	Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal Power Construction Co Ltd			Bank银行：		Saudi Awwal Bank			
				Bank account银行账号：		SA8745000000242429082080		Swift Code:	SABBSARI
Contract Name合同名称：	Main Mechanical & Air Cooled Condenser & HP PipingInstallation Project					Notification: 编制说明：	本次进度款申请，不含税产值金额为7893997.92SAR，含税金额为9078097.61SAR，扣除保证金1361714.64SAR（5%安全保证金+10%预付款扣回），开票金额为7716382.97SAR，本次应付7716382.97SAR		
Contract No.合同编号：	SAQ2-GCHT-2024-046		Contract Value 合同金额	SAR 228,302,478.55					
Item 项目名称	To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period（SAR） 本期金额	To Date（SAR） 本月累计	%	Reviewed by审核人：	王超涛	Date of Operate日期：	2026.10.1
I.Advanve Payment 工程预付款（含税）	**21,807,474.81**			**21,807,474.81**		**Dept会签部门**	**Advice会签意见**	**Signer会签人**	**Time会签时间**
II.Progress Payment 完成产值（不含税）	**164,160,737.05**	**83%**	**7,893,997.92**	**172,054,734.97**	**87%**	Construction Management Department 工程管理部	拟同意	张宏林	2026.10.01
III.Deducted Items 扣款明细									
1.Workers' salary payment 人工代付						Quality Management Department: 质量管理部	拟同意	郑伟	2026.10.01
2.Material requisition 材料领用									
3.Mechanical equipment rental 机械租赁						HSE Department 安健环部	拟同意	李北洋	2026.10.01
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties考核奖惩									
5.Others 其他						Planning&Contract Department 计划合同部	拟同意	高峰	2026.10.01
IV.Settlement Output Value 结算产值（含税）	**188,784,847.63**	**83%**	**9,078,097.61**	**197,862,945.24**	**87%**				
1.Defect liability security 质量保证金						Depuy Project Director /Chief engineer 副经理/总工	拟同意	王子超杰	2026.10.01
2.Safety security 安全保证金	**8,127,324.64**		**453,904.88**	**8,581,229.52**					
3.Progress security 结算保留金						Depuy Project Director /Chief engineer 副经理/总工	拟同意	王子超杰	2026.10.01
4.Payment deduction 预付款扣回	**16,254,649.29**		**907,809.76**	**17,162,459.05**					
V.Net Payment 实付款	**186,210,348.50**	**82%**	**7,716,382.97**	**193,926,731.47**	**85%**	Project Director 项目经理	同意	郭辉涛	2026.10.02
The Subcontractor Representative: 分包方代表：									

(Sign and Stamp)(签字/盖章)
Qassim 2 Project
CEEC ZTPC Saudi Arabia Branch

中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

主机、空冷器及高压管道安装工程进度款报表

Main Mechanical & Air Cooled Condenser & HP PipingInstallation Project progress report

Report Company填报单位：Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal Power Construction Co Ltd

Unit单位：SAR

No. 序号	Project Name 项目名称	Unit 单位	Contract Quantity合同量			Completion Quantity完成量								
			Number 数量	Unit Price 单价	Total Price 合价	To Last Month 上月累计数量	Output Value to Last Month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output Value of This Month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output Value of This Month 本月审核产值	To This Month 累计完成数量	Toal Output Value 累计完成产值	%
一	主机安装工程													
1	燃气轮机本体设备安装 燃气轮机间（本体）275～310MW	套	3	3273031.70	9819095.11	2.88	9426331.31	0.04	130921.27	0.04	130921.27	2.92	9557252.58	97.33%
2	燃气轮机本体设备安装 燃气轮发电机间（本体）275～310MW	套	3	470696.95	1412090.86	2.88	1355607.22	0.04	18827.88	0.04	18827.88	2.92	1374435.10	97.33%
3	燃气轮机进气装置安装 275～310MW	t	720	1936.33	1394156.75	691.20	1338390.48	28.80	55766.27	28.80	55766.27	720.00	1394156.75	100.00%
4	烟气旁路装置安装 排气装置 275～310MW	t	225	1611.44	362573.13	216.00	348070.20	9.00	14502.93	9.00	14502.93	225.00	362573.13	100.00%
5	燃气轮发电机组整套空负荷试运配合 275～310MW	套	3	343718.36	1031155.08									
6	燃气轮机附属设备安装 双燃料 230～275MW	套	3	312153.13	936459.38	2.76	861542.63	0.15	46822.97	0.15	46822.97	2.91	908365.60	97.00%
7	锅炉辅助设备安装 设备平台、扶梯、栏杆、支架安装	t	200	3874.49	774899.00	184.00	712907.08	16.00	61991.92	16.00	61991.92	200.00	774899.00	100.00%
8	烟气旁路装置安装 钢旁路烟囱 275～310MW	t	450	1778.44	800298.59	427.50	760283.66	22.50	40014.93	22.50	40014.93	450.00	800298.59	100.00%
9	余热锅炉本体安装 蒸发量 360～420t/h	t	19471.2	2311.29	45003631.83	17913.50	41403341.29	1557.70	3600290.55	1557.70	3600290.55	19471.20	45003631.84	100.00%
10	余热锅炉本体钢烟囱安装 卧式锅炉	t	792.3	2311.29	1831236.78	728.92	1684728.59	63.38	146498.94	63.38	146498.94	792.30	1831227.53	100.00%
11	制氢站设备及管道安装 氢气汇流排架	套	2	7965.63	15931.26			2.00	15931.26	2.00	15931.26	2.00	15931.26	100.00%
12	离心式送风机、一次风机安装 G4-73-11 No18D 143392～237882m³/h	台	6	45546.94	273281.61			6.00	273281.61	6.00	273281.61	6.00	273281.61	100.00%
13	起重设备安装 电动葫芦 2t	台	12	1151.05	13812.63			12.00	13812.63	12.00	13812.63	12.00	13812.63	100.00%
14	锅炉辅助设备安装 定期排污扩容器 V≤15m³	台	3	5035.59	15106.76	2.00	10071.17	1.00	5035.59	1.00	5035.59	3.00	15106.76	100.00%
15	汽机其他附属设备安装 连续排污扩容器 V≤10m³	台	3	6959.70	20879.11	2.00	13919.40	0.70	4871.79	0.70	4871.79	2.70	18791.20	90.00%
16	锅炉用交流自动、直流自动快速电梯安装 80m 6-8站	部	1	119219.57	119219.57			1.00	119219.57	1.00	119219.57	1.00	119219.57	100.00%
17	单级离心式耐腐蚀泵安装 N≤7.5kW	台	6	888.55	5331.30			6.00	5331.30	6.00	5331.30	6.00	5331.30	100.00%
18	起重设备安装 工字钢轨道 I40	m	90	272.09	24488.27	54.00	14692.96	36.00	9795.31	36.00	9795.31	90.00	24488.27	100.00%
19	凝汽式汽轮发电机组安装（桥式起重机起吊法）600MW	套	2	7966289.70	15932579.40	1.64	13064715.11					1.64	13064715.11	82.00%

中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

主机、空冷器及高压管道安装工程进度款报表

Main Mechanical & Air Cooled Condenser & HP PipingInstallation Project progress report

Report Company填报单位：Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal Power Construction Co Ltd

Unit单位：SAR

No. 序号	Project Name 项目名称	Unit 单位	Contract Quantity合同量			Completion Quantity完成量								
			Number 数量	Unit Price 单价	Total Price 合价	To Last Month 上月累计数量	Output Value to Last Month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output Value of This Month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output Value of This Month 本月审核产值	To This Month 累计完成数量	Toal Output Value 累计完成产值	%
20	汽轮机辅助及附属设备安装 300MW	套	2	1780681.60	3561363.20	1.20	2136817.92	0.40	712272.64	0.40	712272.64	1.60	2849090.56	80.00%
21	高低压旁路系统安装（机组容量） 300MW	机组	2	80335.96	160671.93	1.10	88369.56	0.50	40167.98	0.50	40167.98	1.60	128537.54	80.00%
22	电动给水泵安装 流量：782t/h，扬程：3200mH_2O	台	6	152696.88	916181.27	3.30	503899.70	1.70	259584.69	1.70	259584.69	5.00	763484.39	83.33%
23	多级离心泵安装 N≤300kW	台	6	19969.99	119819.95	3.30	65900.97					3.30	65900.97	55.00%
24	多级离心泵安装 N≤100kW	台	9	10950.48	98554.33	4.95	54204.88					4.95	54204.88	55.00%
25	汽机其他附属设备安装 疏水扩容器 V≤10m³	台	4	5211.99	20847.95	2.20	11466.37					2.20	11466.37	55.00%
26	单级离心式耐腐蚀泵安装 N≤7.5kW	台	8	888.55	7108.40	4.40	3909.62					4.40	3909.62	55.00%
27	起重设备安装 电动葫芦 20t	台	9	4378.09	39402.80	4.95	21671.54					4.95	21671.54	55.00%
28	起重设备安装 电动葫芦 5t	台	8	2481.34	19850.70	4.40	10917.88					4.40	10917.88	55.00%
29	起重设备安装 电动葫芦 2t	台	3	1151.05	3453.16	1.65	1899.24					1.65	1899.24	55.00%
30	电动双梁桥式起重机安装 100/20t Lk=31m	台	2	51648.58	103297.15	1.20	61978.29					1.20	61978.29	60.00%
31	起重设备安装 工字钢轨道 I40	m	70	272.09	19046.43	42.00	11427.86					42.00	11427.86	60.00%
32	起重设备安装 工字钢轨道 I40	m	150	272.09	40813.79	90.00	24488.27					90.00	24488.27	60.00%
33	直接空气冷却系统设备安装 冷却风机组安装 风机直径 9m	台	60	20428.79	1225727.23	57.00	1164440.87	3.00	61286.36	3.00	61286.36	60.00	1225727.23	100.00%
34	机力通风冷却塔风机安装 Φ4.7m	台	28	12818.68	358923.01			28.00	358923.01	28.00	358923.01	28.00	358923.01	100.00%
35	直接空气冷却系统设备安装 空冷凝汽器管束及联箱安装 单排管	片	1260	5846.88	7367067.28	1159.20	6777701.90	100.80	589365.38	100.80	589365.38	1260.00	7367067.28	100.00%
36	直接空气冷却系统设备安装 蒸汽分配管安装 蒸汽分配管	t	1020	6351.46	6478493.43	938.40	5960213.95	81.60	518279.47	81.60	518279.47	1020.00	6478493.43	100.00%
37	直接空气冷却系统设备安装 清洗装置安装	台	3	1421.62	4264.86			3.00	4264.86	3.00	4264.86	3.00	4264.86	100.00%
38	直接空气冷却系统设备安装 管束"A"型支撑架安装 管束及"A"型支撑架安装	t	1575	2226.30	3506414.74	1449.00	3225901.56	126.00	280513.18	126.00	280513.18	1575.00	3506414.74	100.00%
39	直接空气冷却系统设备安装 单元分隔墙安装	t	368	2882.45	1060742.77	338.56	975883.3445	29.44	84859.42	29.44	84859.42	368.00	1060742.77	100.00%
40	直接空气冷却系统设备安装 严密性试验 600MW	机组	3	53990.48	161971.43									
二	高压管道安装工程													

中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

主机、空冷器及高压管道安装工程进度款报表

Main Mechanical & Air Cooled Condenser & HP PipingInstallation Project progress report

Report Company填报单位：Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal Power Construction Co Ltd　　Unit单位：SAR

No. 序号	Project Name 项目名称	Unit 单位	Contract Quantity合同量			Completion Quantity完成量								
			Number 数量	Unit Price 单价	Total Price 合价	To Last Month 上月累计数量	Output Value to Last Month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output Value of This Month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output Value of This Month 本月审核产值	To This Month 累计完成数量	Toal Output Value 累计完成产值	%
1	主蒸汽管道安装 300MW 亚临界	t	857.849	9458.18	8113687.09	850	8039449.862					850.00	8039449.86	99.09%
2	主蒸汽管道安装 300MW 亚临界	t	65.427	6454.99	422330.89	55	355024.6706					55.00	355024.67	84.06%
3	再热蒸汽热段管道安装 300MW 超临界	t	1912.215	10659.45	20383158.70	1790	19080414.12					1790.00	19080414.12	93.61%
4	再热蒸汽热段管道安装 300MW 超临界	t	108.161	6454.99	698178.61	90	580949.461					90.00	580949.46	83.21%
5	再热蒸汽冷段管道安装 300MW	t	616.778	8256.90	5092676.36	560	4623865.898					560.00	4623865.90	90.79%
6	再热蒸汽冷段管道安装 300MW	t	3.587	6454.99	23154.06	3	19364.98203					3.00	19364.98	83.64%
7	主给水管道安装 300MW	t	176.305	8256.90	1455733.35	157	1296333.832					157.00	1296333.83	89.05%
8	蒸汽管道吹洗临时管道安装与拆除 600MW	t	243.2	6351.46	1544676.08									
三	节点奖													
1	进气系统机务移交调试		1.00	200000.00	200000.00			1.00	200000.00	1.00	200000.00	1.00	200000.00	100.00%
2	移交两门子安装最后部件		1.00	200000.00	200000.00									
3	烟囱全部组装完成		1.00	100000.00	100000.00	1.00	100000					1.00	100000.00	100.00%
4	首列管束吊装完成		1.00	100000.00	100000.00	1.00	100000					1.00	100000.00	100.00%
四	新增													
1	EPC生活区扩建	项	1	7370000.00	7370000.00	0.95	7004234.86	0.02	147400.00	0.02	147400.00	0.97	7004234.86	97.04%
2	外籍祈祷室扩建	项	1	370000.00	370000.00	0.80	296000	0.2	74000.00	0.20	74000.00	1.00	296000.00	100.00%
3	金属监测	项	1	4310000.00	4310000.00	0.80	3448000					0.80	3448000.00	80.00%
5	合同外签证预结算 I501	项	1	2179215.62	2179215.62	1.00	2179215.62					1.00	2179215.62	100.00%
6	合同外签证预结算 I502	项	1	2104869.43	2104869.43	1.00	2104869.43					1.00	2104869.43	100.00%
7	湖火切活部分	项	1											
7.1	人工	项	1	24968335	24968335	0.52	13032250.71					0.52	13032250.71	52.44%
7.2	机械	项	1	3226750	3226750	1.40	4506983.84					1.40	4506983.84	139.68%
7.3	材料	项	1	3555981	3555981	0.61	2154210.87					0.61	2154210.87	60.58%
7.4	其他	项	1	3097478	3097478	0.40	1238628.57					0.40	1238628.57	39.99%
7.5	暂列金	项	1	2100000	2100000		1883886.66						1883886.66	
7.6	考核	项	1	1847427	1847427									
五	不含税合计	项	1		198523894.39		164139378.2		7893833.72		7893833.72		172033211.92	
	安全文明措施费（扣回）						3533585.45		197345.84		197345.84		3730931.29	
	安全文明措施费（申请）						3575844.31		197510.04		197510.04		3773354.35	
六	扣款项合计						20900.00						20900.00	
K1	人工代付													

中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

主机、空冷器及高压管道安装工程进度款报表

Main Mechanical & Air Cooled Condenser & HP PipingInstallation Project progress report

Report Company填报单位：Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal Power Construction Co Ltd

Unit单位：SAR

No. 序号	Project Name 项目名称	Unit 单位	Contract Quantity合同量			Completion Quantity完成量								
			Number 数量	Unit Price 单价	Total Price 合价	To Last Month 上月累计数量	Output Value to Last Month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output Value of This Month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output Value of This Month 本月审核产值	To This Month 累计完成数量	Toal Output Value 累计完成产值	%
K2	材料领用													
K3	机械租赁													
K4	考核奖惩						-20000.00						-20000.00	
K4.1	进度考核													
K4.2	质量考核						27900.00						27900.00	
K4.3	安全考核						11300.00						11300.00	
K5	其他						1700.00						1700.00	
八	合计				198523894.39		164160737.05		7893997.92		7893997.92		172054734.97	
九	VAT 15%				29778584.16		24624110.56		1184099.69		1184099.69		25808210.25	
十	含税合计				228302478.55		188784847.63		9078097.61		9078097.61		197862945.24	

Remark：Fund of next month is reported by Subcontractor. Subcontractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Contractor.下月资金计划由分包方填报，并对准确性负责，承包方审核不包括此项内容。

The Subcontractor Representative:
分包方代表：

Construction Management Department:
工程管理部（专业组）审核：

Quality Management Department:
质量管理部（专业组）审核：

HSE Department:
安全管理部（专业组）审核：

Planning & Contract Department:
计划合同部审核：

Progress Application Format

工程形象进度审批表

No. 序号	Project name 项目名称	Unit 单位	Number 数量	Construction Progress 施工进度	Completion Time 完成时间
一	主机安装工程				
1	燃气轮机本体设备安装 燃气轮机间（本体）275～310MW	套	3	97.33%	
2	燃气轮机本体设备安装 燃气轮发电机间（本体）275～310MW	套	3	97.33%	
3	燃气轮机进气装置安装 275～310MW	t	720	100.00%	2026.08.30
4	烟气旁路装置安装 排气装置 275～310MW	t	225	100.00%	2026.05.30
5	燃气轮发电机组整套空负荷试运配合 275～310MW	套	3		
6	燃气轮机附属设备安装 双燃料 230～275MW	套	3	97.00%	
7	锅炉辅助设备安装 设备平台、扶梯、栏杆、支架安装	t	200	100.00%	2026.03
8	烟气旁路装置安装 钢旁路烟囱 275～310MW	t	450	100.00%	2025.10.23
9	余热锅炉本体安装 蒸发量 360～420t/h	t	19471.2	100.00%	2026.08
10	余热锅炉本体钢烟囱安装 卧式锅炉	t	792.3	100.00%	2026.03.13
11	制氢站设备及管道安装 氢气汇流排架	套	2	100.00%	2026.08
12	离心式送风机、一次风机安装 G4-73-11 No18D 143392～237882m³/h	台	6	100.00%	2026.08
13	起重设备安装 电动葫芦 2t	台	12	100.00%	2026.06
14	锅炉辅助设备安装 定期排污扩容器 V≤15m³	台	3	100.00%	2026.03.20
15	汽机其他附属设备安装 连续排污扩容器 V≤10m³	台	3	90.00%	
16	锅炉用交流自动、直流自动快速电梯安装 80m 6-8站	部	1	100.00%	2026.08
17	单级离心式耐腐蚀泵安装 N≤7.5kW	台	6	100.00%	2026.08
18	起重设备安装 工字钢轨道 I40	m	90	100.00%	2026.05
19	凝汽式汽轮发电机组安装（桥式起重机起吊法）600MW	套	2	82.00%	
20	汽轮机辅助及附属设备安装 300MW	套	2	80.00%	
21	高低压旁路系统安装（机组容量） 300MW	机组	2	80.00%	
22	电动给水泵安装 流量：782t/h，扬程：3200mH_2O	台	6	83.33%	
23	多级离心泵安装 N≤300kW	台	6	55.00%	
24	多级离心泵安装 N≤100kW	台	9	55.00%	
25	汽机其他附属设备安装 疏水扩容器 V≤10m³	台	4	55.00%	
26	单级离心式耐腐蚀泵安装 N≤7.5kW	台	8	55.00%	
27	起重设备安装 电动葫芦 20t	台	9	55.00%	
28	起重设备安装 电动葫芦 5t	台	8	55.00%	
29	起重设备安装 电动葫芦 2t	台	3	55.00%	
30	电动双梁桥式起重机安装 100/20t Lk=31m	台	2	60.00%	
31	起重设备安装 工字钢轨道 I40	m	70	60.00%	
32	起重设备安装 工字钢轨道 I40	m	150	60.00%	
33	直接空气冷却系统设备安装 冷却风机组安装 风机直径 9m	台	60	100.00%	2026.07.25
34	机力通风冷却塔风机安装 Φ4.7m	台	28	100.00%	2026.07.25

No. 序号	Project name 项目名称	Unit 单位	Number 数量	Construction Progress 施工进度	Completion Time 完成时间
35	直接空气冷却系统设备安装 空冷凝汽器管束及联箱安装 单排管	片	1260	100.00%	2026.07.30
36	直接空气冷却系统设备安装 蒸汽分配管安装 蒸汽分配管	t	1020	100.00%	2026.08.05
37	直接空气冷却系统设备安装 清洗装置安装	台	3	100.00%	2026.08
38	直接空气冷却系统设备安装 管束"A"型支撑架安装 管束及"A"型支撑架安装	t	1575	100.00%	2026.07.15
39	直接空气冷却系统设备安装 单元分隔墙安装	t	368	100.00%	2026.08
40	直接空气冷却系统设备安装 严密性试验 600MW	机组	3		

The Subcontractor Representative:

分包方：

The Contractor Representative:

承包方：

浙江火电沙特凯西姆安装项目2026年08月份安全生产措施费合账

序号	项目	时间	使用地点	单位	数量	不含税单价(SAR)	含税单价(SAR)	不含税总价(SAR)	含税总价(SAR)	备注
1	安全宣传、教育及培训投入（专项培训、三级安全教育、安全办公用品等）	2026年8月	/	项	1	2000.00	2,300.00	2,000.00	2,300.00	
2	隐患排查治理费用	2026年8月	/	项	1	2000.00	2,300.00	2,000.00	2,300.00	
3	安全标准化设施（安全网、脚手架搭设安全围栏等）	2026年8月	现场施工区域	项	1	105000.00	120,750.00	105,000.00	120,750.00	
4	特殊工种及设备认证费用	2026年8月	特殊工种认证、特种设备认证	项	1	1035.00	1,190.25	1,035.00	1,190.25	
5	完善、改造和维护安全防护设施设备支出	2026年8月	现场施工区域	项	1	87475.04	100,596.30	87,475.04	100,596.30	
			合计					**197,510.04**	**227,136.55**	

分包方代表：

HSE安全部门审核：

计划合同部审核：

安全宣传、教育及培训









脚手架材料搭设安全围栏










安全网

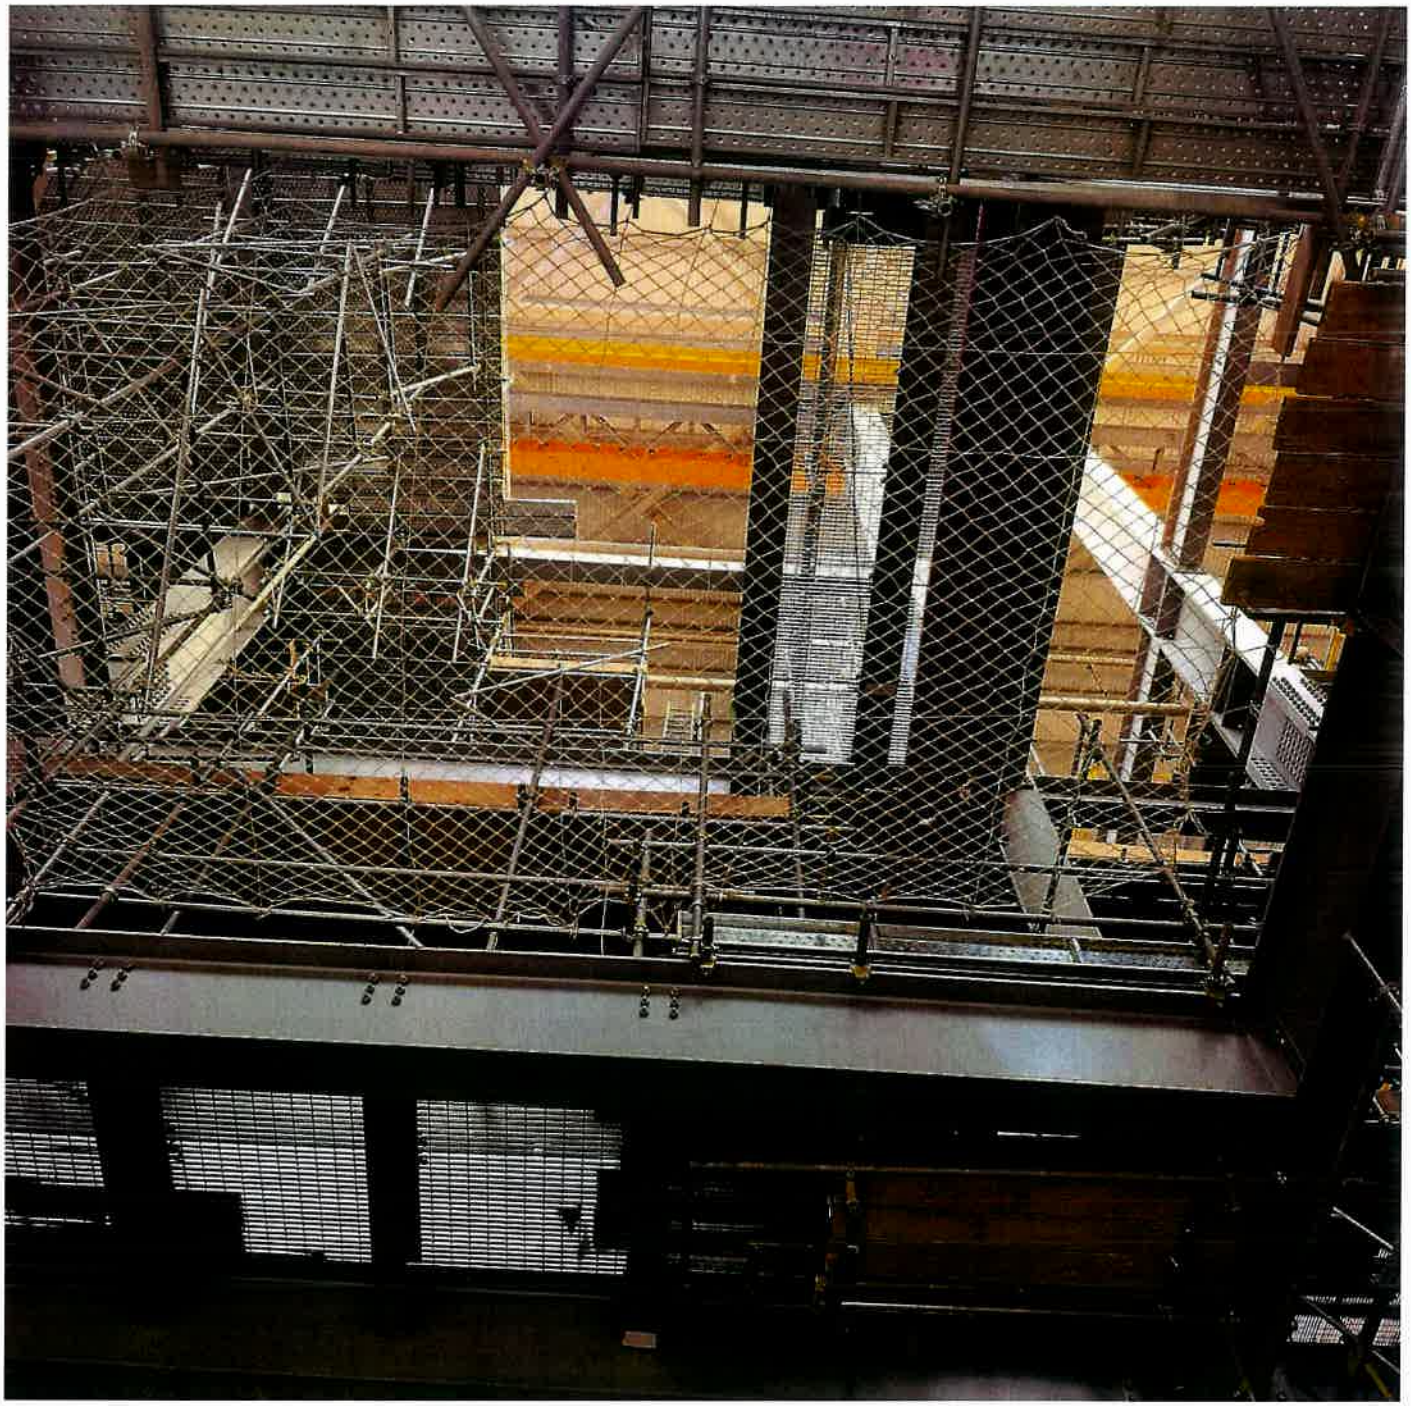

密目网









الشركة العالمية لخدمات التفتيش المحدودة
UNIVERSAL INSPECTION CO. LTD.
CR No. 2055011643
س. ت ٢٠٥٥٠١١٦٤٣
CERTIFIED ISO 9001 : 2008 & OHSAS 18001:2007

PROFORMA INVOICE

No.: UIC/RIY-P/2203
Date: 02-Aug-2026

To: **Branch of China Energy Engineering Group Zhejiang Thermal power Construction Company Limited**
Ar-Riyadh Kingdom of Saudi Arabia
310407838800003

Customer Ref.
Client Code : 1796

Sl. No.	PARTICULARS	QTY (UOM)	Unit Price (SAR)	AMOUNT (SAR)
1.	Crawler Crane Operator	1 EA	300.00	300.00
2.	Boom Truck	1 EA	300.00	300.00
3.	Transport charges	1 EA	300.00	300.00
			TOTAL (SAR)	**900.00**
			VAT (15%)	**135.00**
			NET AMOUNT (SAR)	**1035.00**

TERMS OF PAYMENT: **CASH/CHEQUE/TRANSFER**

P.O. Box No. 2072, Jubail - 31951, K.S.A.
Tel.: +966 13 367 0515 / Fax: +966 13 344 8881 www.ui.com.sa
Tel.: +966 13 344 8882

ص. ب ٢٠٧٢ ، الجبيل ٣١٩٥١ - المملكة العربية السعودية
هاتف ٠٥١٥ ٣٦٧ ١٣ ٩٦٦+ / فاكس ٨٨٨١ ٣٤٤ ١٣ ٩٦٦+
هاتف ٨٨٨٢ ٣٤٤ ١٣ ٩٦٦+
